

## A piaristák budapesti építkezése.


(Folytatás.)

A székesfőváros az 1485 □-öl kiterjedésű telket 1913. évi december hó 2-án adta át hivatalosan a kegyesrendnek és az építkezést a *Kondor és Feledi* cég még aznap megkezdte az alapárkok kiásásával. Az építkezés teljes erővel folyt, különösen az 1914. év tavaszán. Az alapozás után a falak gyorsan emelkedtek, mert átlag 4–5 száz munkás dolgozott. A *háború kitörése* azonban nagy akadályt gördített az építkezés elé, mert az általános mozgósítás kihirdetésekor, 1914. évi július hó végén a munkások fele

tárgyává tétetett, hogy nem lenne-e tanácsos a III. emelet elkészülte után az építkezést a háború befejezéséig félbe hagyni. De a rendkormány — miután a pénzüzetekkel megállapodott abban, hogy a vállalkozók heti kereseti kimutatásainak kifizetésére a szükséges összegeket kiadják — az építkezés rendes folytatása mellett határozott, mert tartani kellett attól, hogy a vállalkozók szerződéseiket fölmondják, s ha a háború után az építkezés folytatását meg kellene kezdeni, az új szerződések már csak jelentékenyen nagyobb követelésekkel lennének megköthetők. Így is az első szerződés alapján a vállalkozók igen nehéz helyzetbe jutottak, mert a háború kitörése óta úgy az építő anyagok



12. A főgimnázium homlokzata.

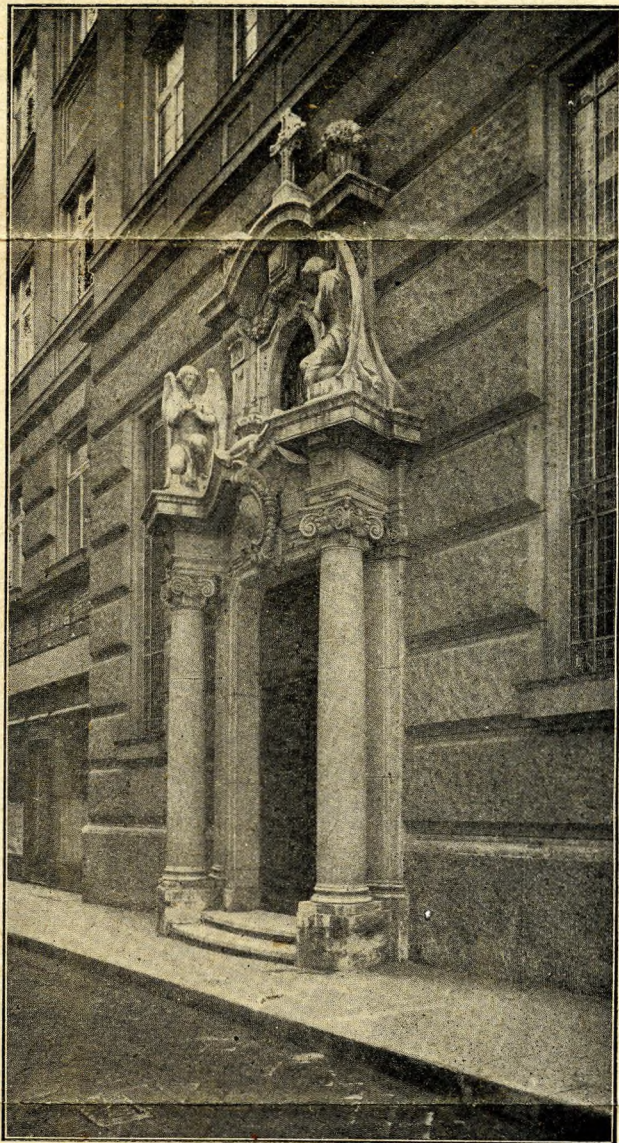

13. A kápolna kapuja.

a hadba vonult, a részleges mozgósítás és a későbbi sorozások után pedig még inkább csökkent a munkások száma; ezért a háború, mint vis major, nemcsak kötelező erejétől fosztotta meg a szerződésnek azt a pontját, mely szerint a vállalkozók az épületet teljesen készen 1915. évi június 1-én tartoznak átadni, de a befejezés határidejét teljesen bizonytalanná tette; és bár a vállalkozók jóakarata ellen kifogás alig merült föl, az épület csak 1917. tavaszán lett használható. A kényes munkát igénylő kápolna pedig csak 1918. szeptemberben készülhetett el. Ezért a székesfőváros beleegyezett abba, hogy a régi épületet nem 1916. évi április 30-án, hanem 1917. évi május első napján veszi át. Továbbá a pénzüzetek, melyekben a rendnek az építésre szánt tőkét elhelyezve voltak, a moratóriumra való hivatkozással nem szívesen adták ki a szükséges összegeket úgy, hogy már 1914. évi augusztusban kérdés

ára, mint azok szállítása és a munkások bére úgyszólván hétről-hétre növekedett. Erre hivatkozva, néhány munkanem vállalkozója kért is a szerződésileg megállapított összegben felül bizonyos százaléknál ráfizetést.

A faleyent 1914. évi október hó 3-án érték el, és október 5-én tüzték ki a zöldágot.

Az épület belső felszerelő munkáinak megkezdése előtt, 1914. évi december hó 2-án tartott konzisztóriumban a rendkormány elhatározta, hogy az eredetileg 70 rendi növendékre tervezett Kalazantinumban, a jövő eshetőségre való tekintetből, még 10, tehát összesen 80 növendék részére foglaljanak le és rendezzenek be lakást.

Ami az épület szerkezeteit illeti, ezek a legszolidabb anyagokból készültek, hogy az épület fönntartásának költsége a lehető legkisebb legyen.

(Folyt. köv.)

